# 전체 공정표 [ 대현동 37-2 ]

□ 현장명 : 대현동 37-2 번지 오피스텔 신축공사

작성일 : 2024년 3월

| 공종 | | 보할 |
|---|---|---|
| 마일스톤 | 인허가 | 인허가 |
| | 설계도서 | 설계 |
| 자재발주 | 철골 | |
| | 철근 | |
| | 갱폼/알폼 | |
| | 창호,유리 | |
| | 석재 | |
| | 엘리베이터 | |
| 토목 | 부대 토목 | 0.56 |
| | 흙막이공사 | 7.04 |
| | 지반 보강 | 1.80 |
| | 소 계 | 9.39 |
| 건축 | 공통가설 | 3.68 |
| | 철콘조 | 2.06 |
| | 철골조 | 27.96 |
| | 철골공사 | 0.67 |
| | 조적 | 4.72 |
| | 미장 | 1.74 |
| | 타일 | 4.86 |
| | 석재 | 1.60 |
| | 방수 | 0.11 |
| | 지붕 | 0.61 |
| | 보온 | 1.19 |
| | 금속 | 4.45 |
| | 창호 | 0.69 |
| | 유리 | 1.14 |
| | 도장 | 4.55 |
| | 부대 | 0.12 |
| | 폐기 | |
| | 소 계 | 60.16 |
| 조경 | 조경 | 1.20 |
| | 소 계 | 1.20 |
| 기계 | 기계. | 16.39 |
| | 소 계 | 16.39 |
| 전기 | 전기 | 7.18 |
| | 소 계 | 7.18 |
| 통신 | 통신 | 3.90 |
| | 소 계 | 3.90 |
| 소방 | 전기 | 1.79 |
| | 소 계 | 1.79 |
| 합 계 | | 100.0 |

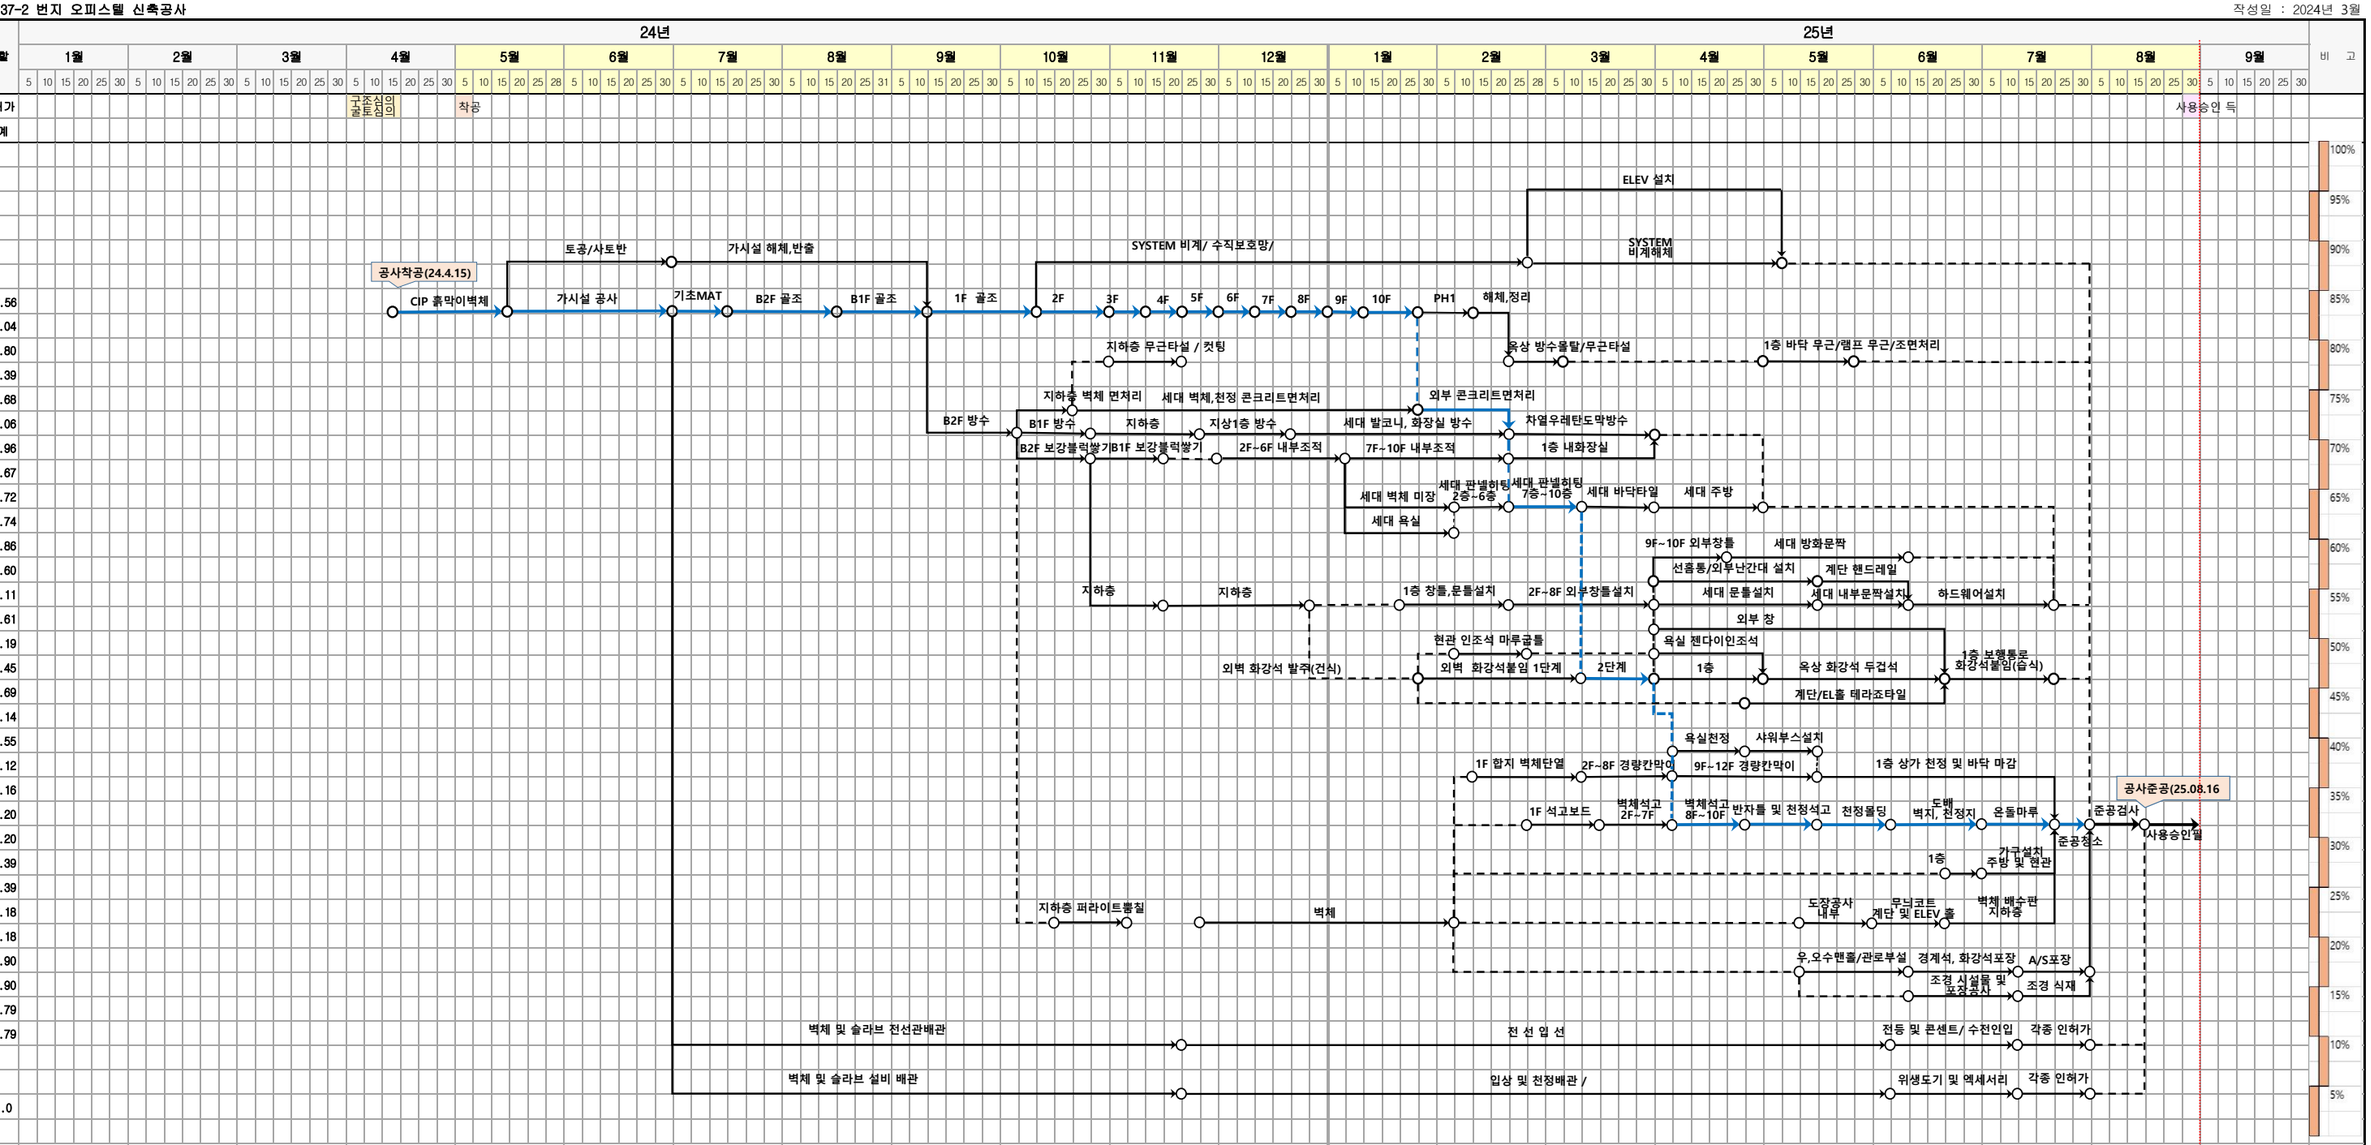


| | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정공정율 | - | - | - | 1.50 | 2.00 | 5.20 | 5.60 | 6.00 | 6.50 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.20 | 6.80 | 5.78 | 5.22 | 2.80 | - |
| 누계공정율 | - | - | - | 1.50 | 3.50 | 8.70 | 14.30 | 20.30 | 26.80 | 33.60 | 40.80 | 48.00 | 56.20 | 64.40 | 72.20 | 79.40 | 86.20 | 91.98 | 97.20 | 100.00 | - |

비고
